

參、工作執行照片



日期：102.09.29

地點：飯店大廳

廠驗前預備會議（討論工作內容及行程安排）



日期：102.09.30

地點：Hilton Valve公司

本局參加廠驗成員 Hilton Valve公司前留影



日期：102.09.30

檢查前說明會議


地點：Hilton Valve會議室



日期：102.09.30

檢查前說明會議暨射流閘門模型拆裝示範


地點：Hilton Valve會議室

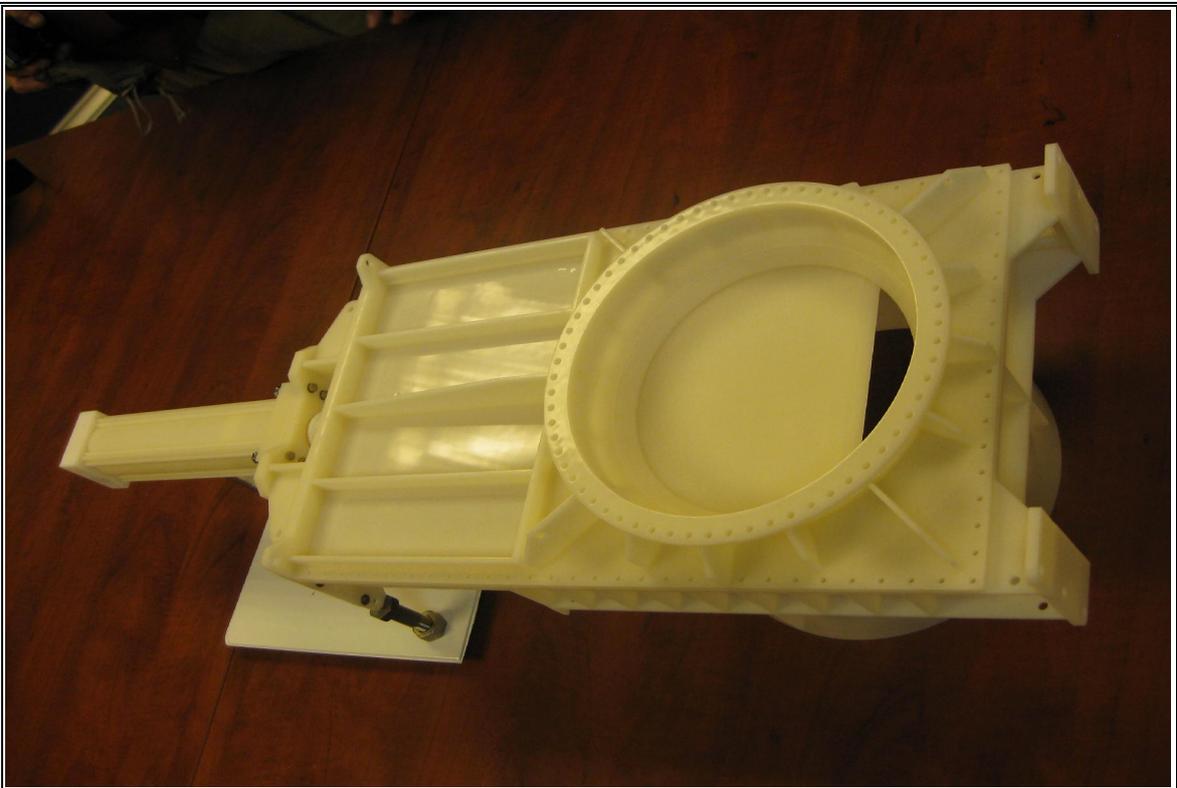

日期：102.09.30

射流閘門模型（拆解前）

地點：Hilton Valve會議室

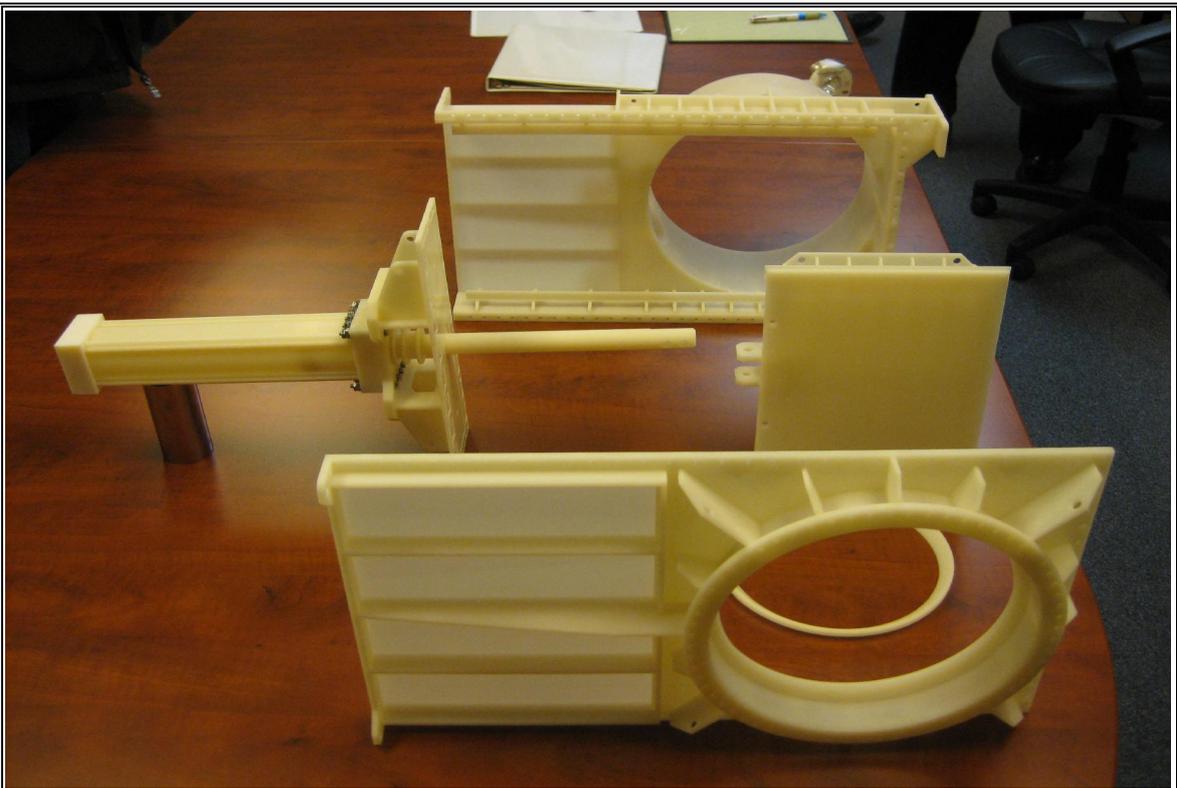

日期：102.09.30

射流閘門模型（拆解後）

地點：Hilton Valve會議室



日期：102.09.30	射流閘門 < JFG > 水壓試驗、水密試驗（南
地點：Hilton Valve工廠	水局、三源興、Hilton Valve 第三公證）




日期：102.09.30	No.2JFG水壓試驗（一）
地點：Hilton Valve工廠	



日期：102.09.30

No.2JFG水壓試驗（二）壓力表歸零

地點：Hilton Valve工廠

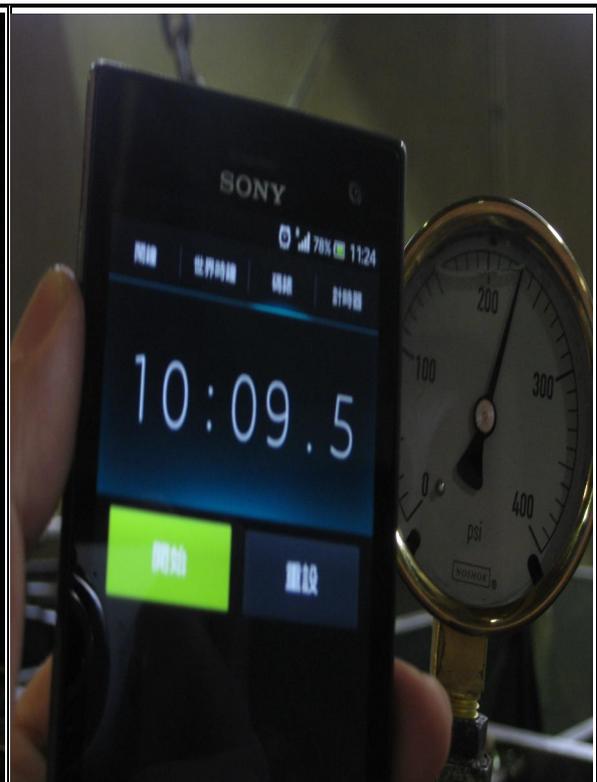

日期：102.09.30

No.2JFG水壓試驗（三）以設計水壓 1.2

地點：Hilton Valve工廠

倍 16.2Kg/cm² (約 230psi) 試壓 10分鐘



日期：102.09.30

No.2JFG水壓試驗（四）金屬接合處及軸

地點：Hilton Valve工廠

封等零配件漏水、變形檢查。



日期：102.09.30

No.1JFG水壓試驗（一）加壓前作業檢視

地點：Hilton Valve工廠

（壓力表、加壓泵及管線等）




日期：102.09.30

No.1JFG水壓試驗（二）金屬接合處及軸

地點：Hilton Valve工廠

封等零配件漏水、變形檢查。

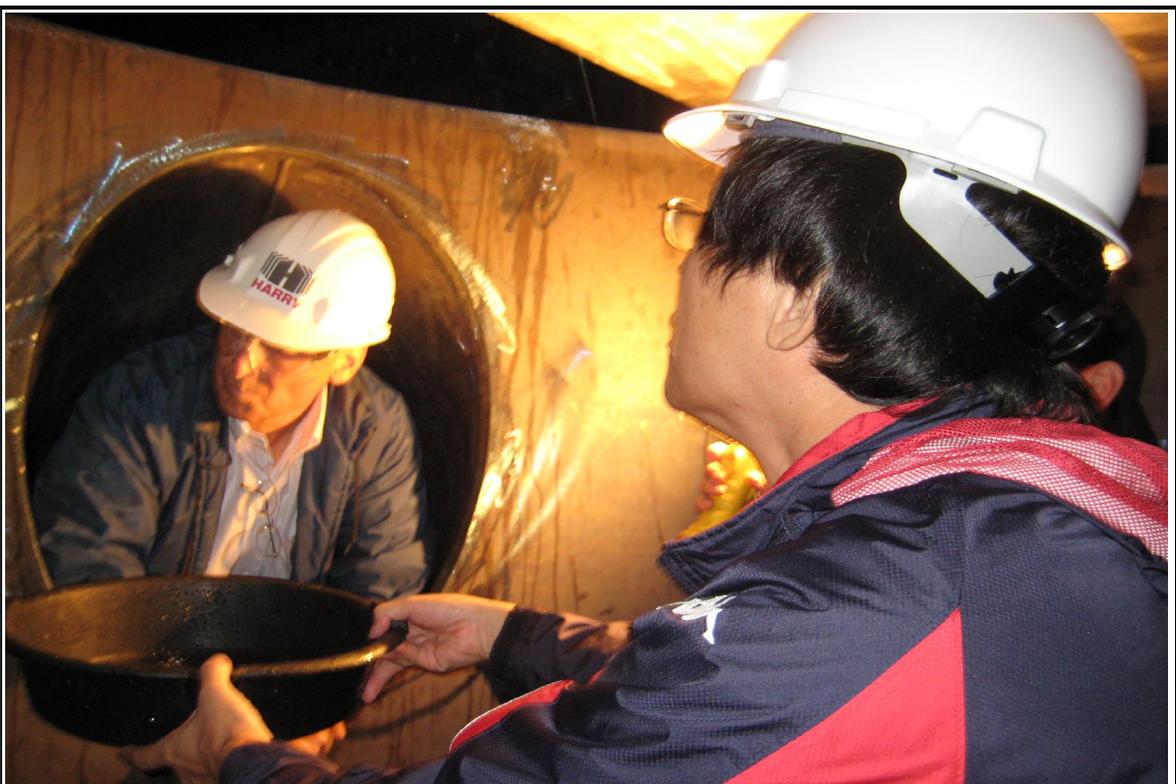


日期：102.09.30

No.1JFG水密試驗（一）檢查暨蒐集漏水

地點：Hilton Valve工廠



日期：102.09.30	No.1JFG水密試驗（二） 測試結果漏水量符合標準（經檢測漏水量 1,030 CC / 10分鐘
地點：Hilton Valve工廠	< 標準值 1,316.25CC)

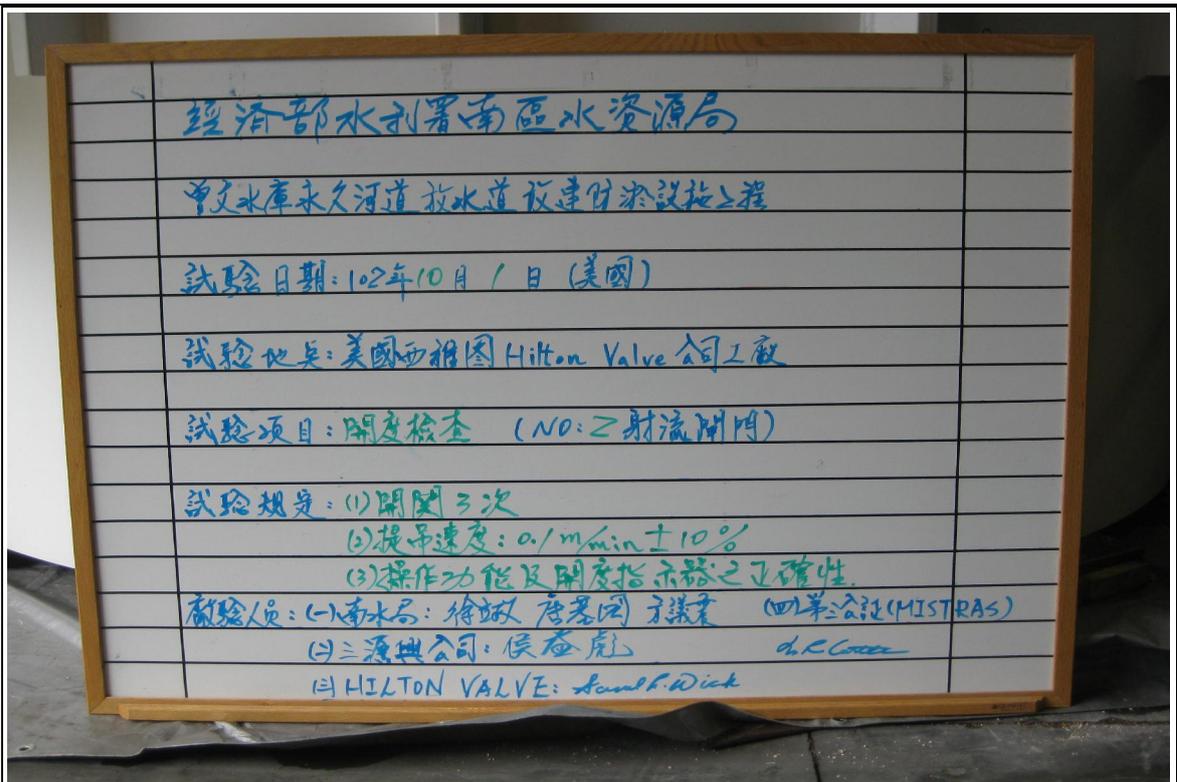


日期：102.10.01	No.2JFG開啟關閉測試（一）
地點：Hilton Valve工廠	



日期：102.10.01

No.2JFG開啟關閉測試（二）


地點：Hilton Valve工廠

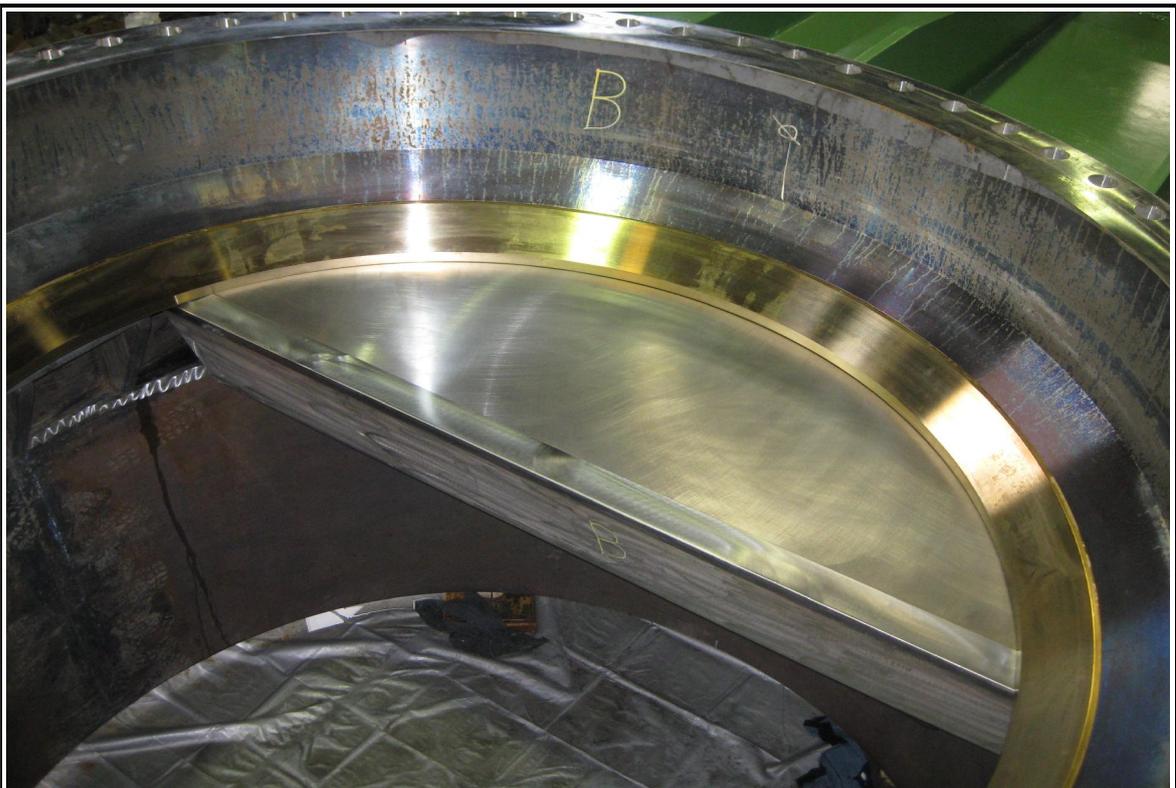

日期：102.10.01

No.2JFG開啟關閉測試（三）

地點：Hilton Valve工廠

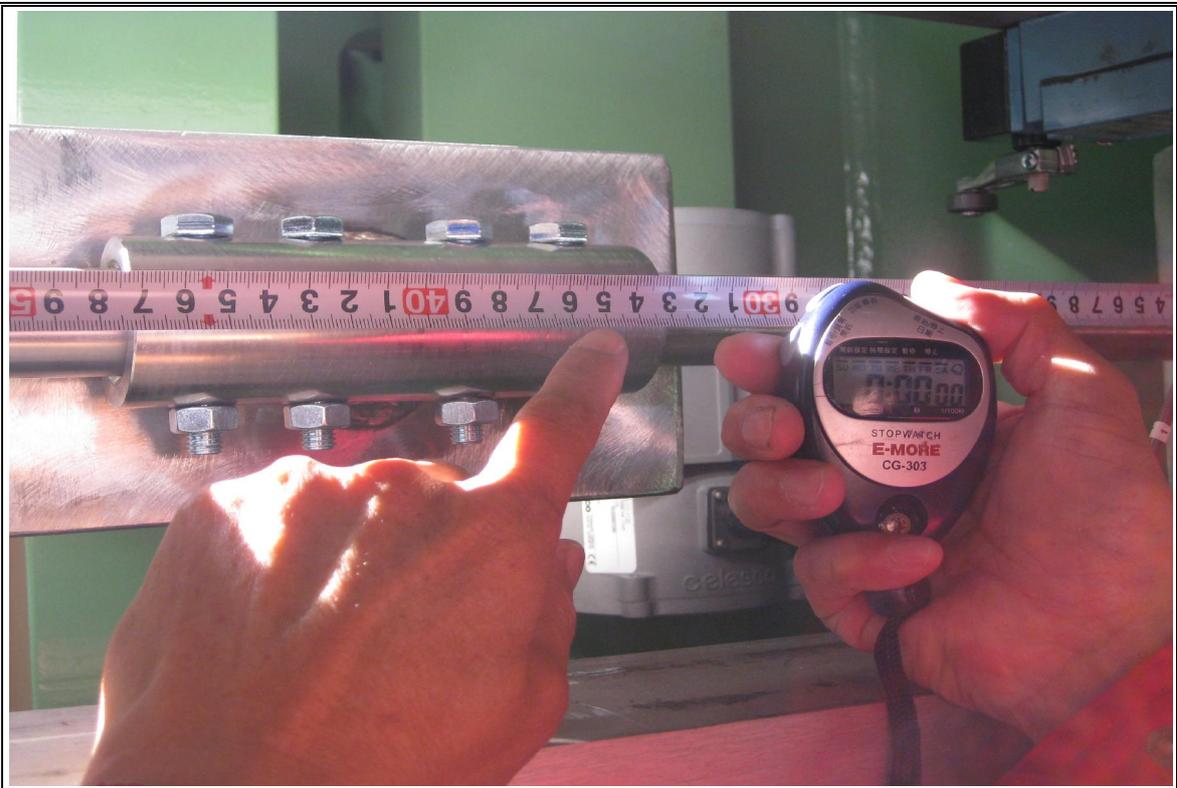

日期：102.10.01	No.2JFG開啟關閉測試（四） 確認機械式
地點：Hilton Valve工廠	開度指示器之正確性



日期：102.10.01	No.1JFG開啟關閉測試（一）
地點：Hilton Valve工廠	




日期：102.10.01

No.1JFG開啟關閉測試（二）確認機械式

地點：Hilton Valve工廠

開度指示器之正確性

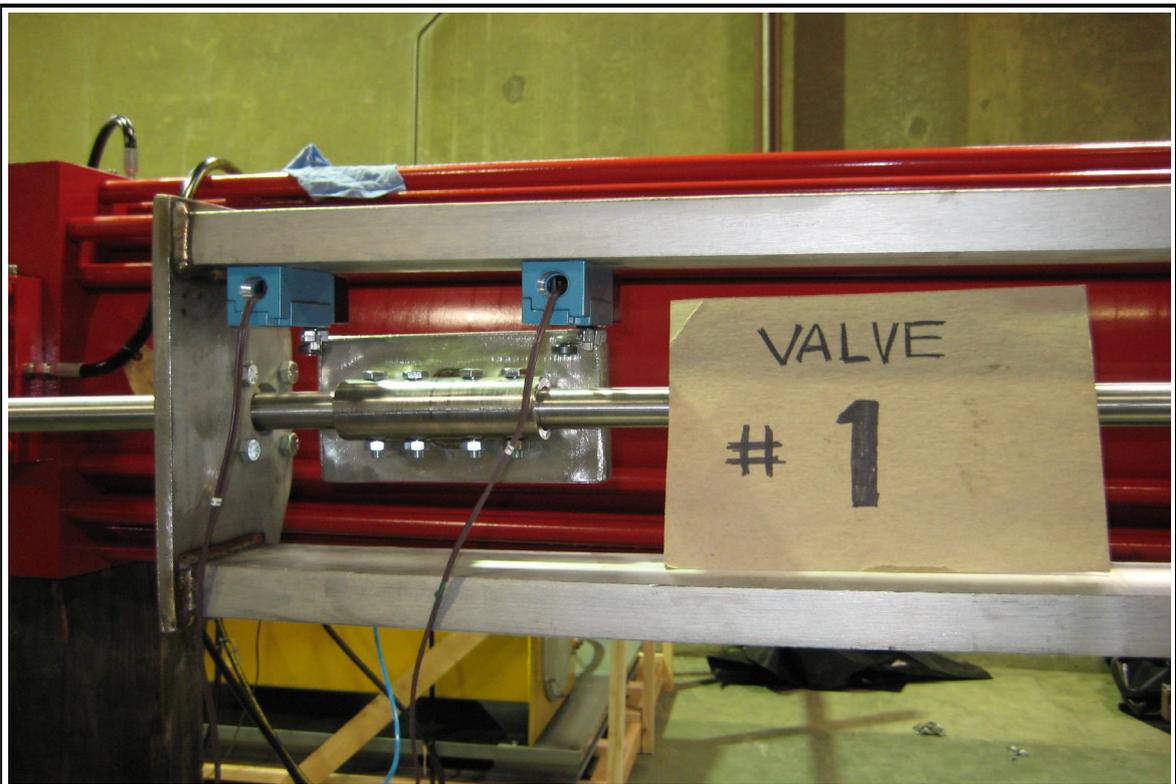

日期：102.10.01

No.1JFG開啟關閉測試（三）測試閘門全

地點：Hilton Valve工廠


開時自動鎖定裝置



日期：102.10.02

No.2JFG水密試驗（一）測試過程發現水密部漏水量超標，同意拆解檢查並磨整後再測。

地點：Hilton Valve工廠

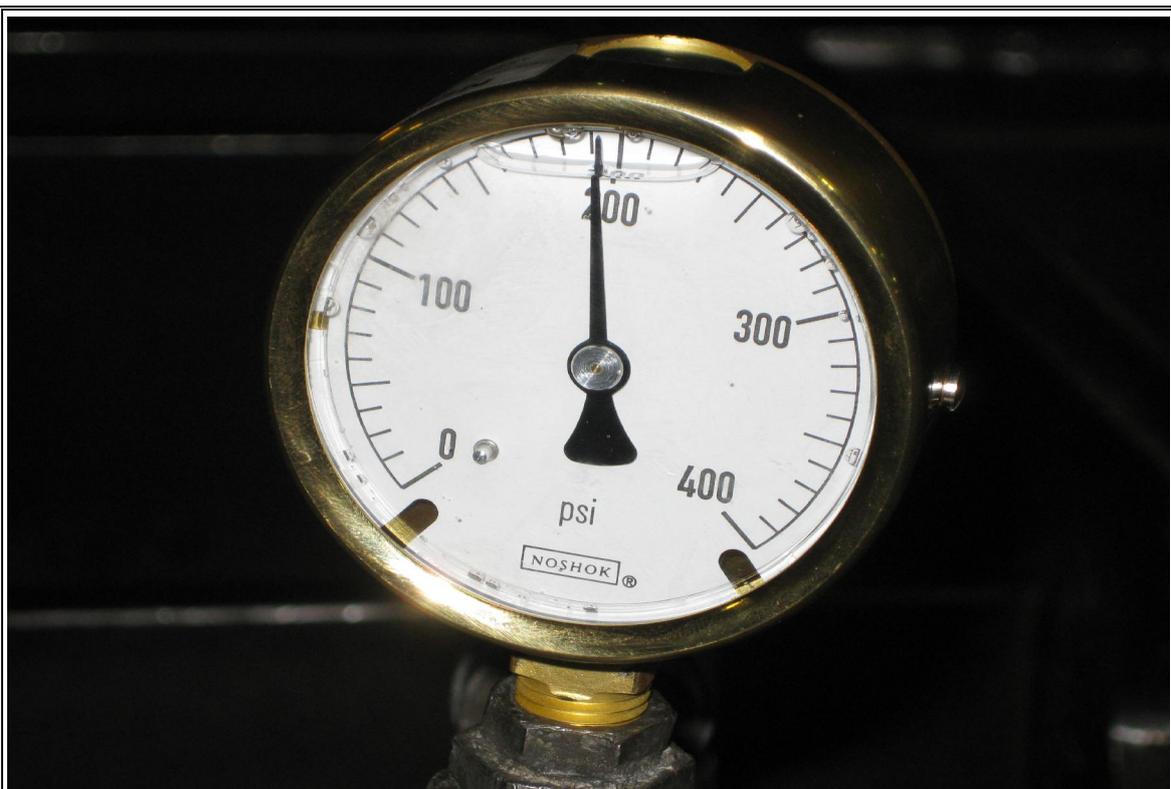

日期：102.10.02

No.2JFG水密試驗（二）以設計水壓

地點：Hilton Valve工廠

13.5Kg/cm² (約 192psi) 持壓 10分鐘



日期：102.10.02

No.2JFG水密試驗（二） 檢查暨蒐集漏水

地點：Hi l ton Valve工廠



日期：102.10.02

No.2JFG第二次水密試驗（三） 測試結果
漏水量符合標準 (經檢測漏水量 70 CC /10
分鐘 < 標準值 1,316.25CC)

地點：Hi l ton Valve工廠



日期：102.10.03	No.1JFG及 No.2JFG膜厚檢查 (膜厚計校正
地點：Hilton Valve工廠	暨有效日期)



日期：102.10.03	No.1JFG膜厚檢查
地點：Hilton Valve工廠	



日期：102.10.03

No.2JFG膜厚檢查


地點：Hilton Valve工廠



日期：102.10.03

No.1JFG尺寸檢查

地點：Hilton Valve工廠

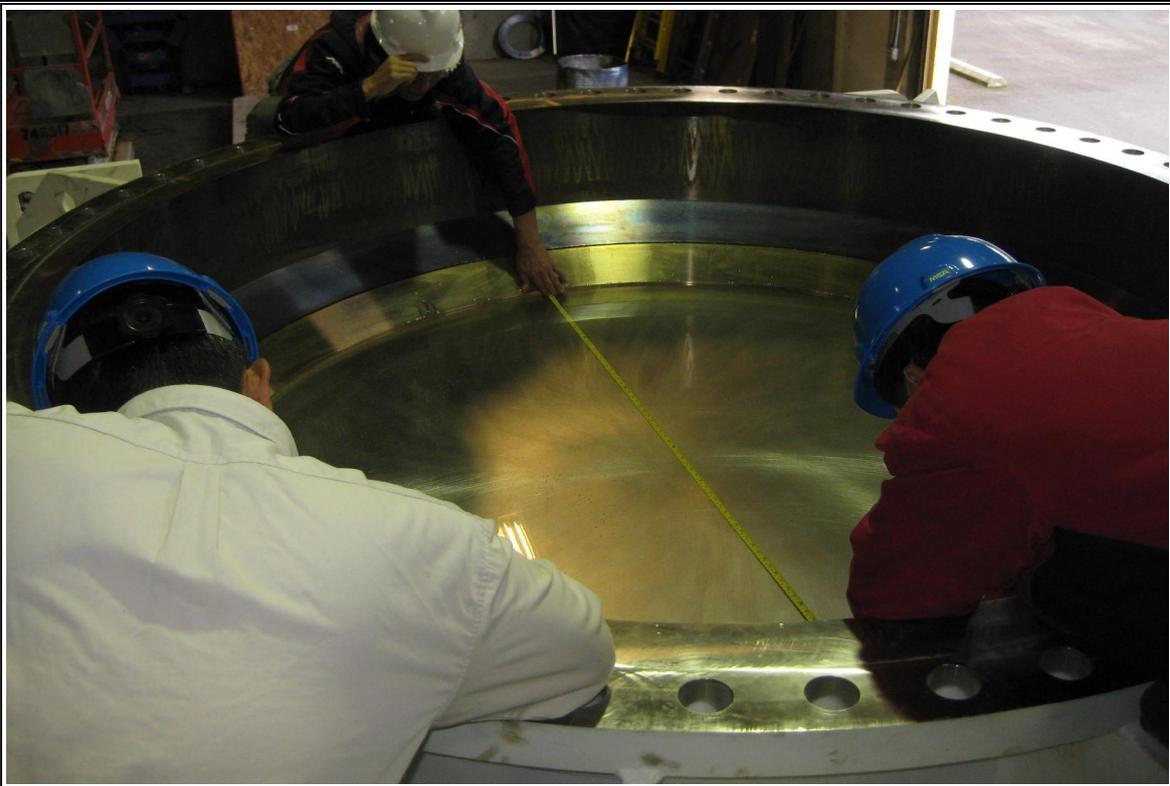

日期：102.10.03

No.2JFG尺寸檢查

地點：Hi l ton Valve工廠



日期：102.10.04

文件審查（一）射流閘門材料文件等檢查

地點：Hi l ton Valve會議室



日期：102.10.04

文件審查（二）射流閘門材料文件等檢查

地點：Hilton Valve會議室




日期：102.10.04

文件審查（三）射流閘門非破壞檢驗報告

地點：Hilton Valve會議室

檢查（鋁青銅水封 RT檢測）

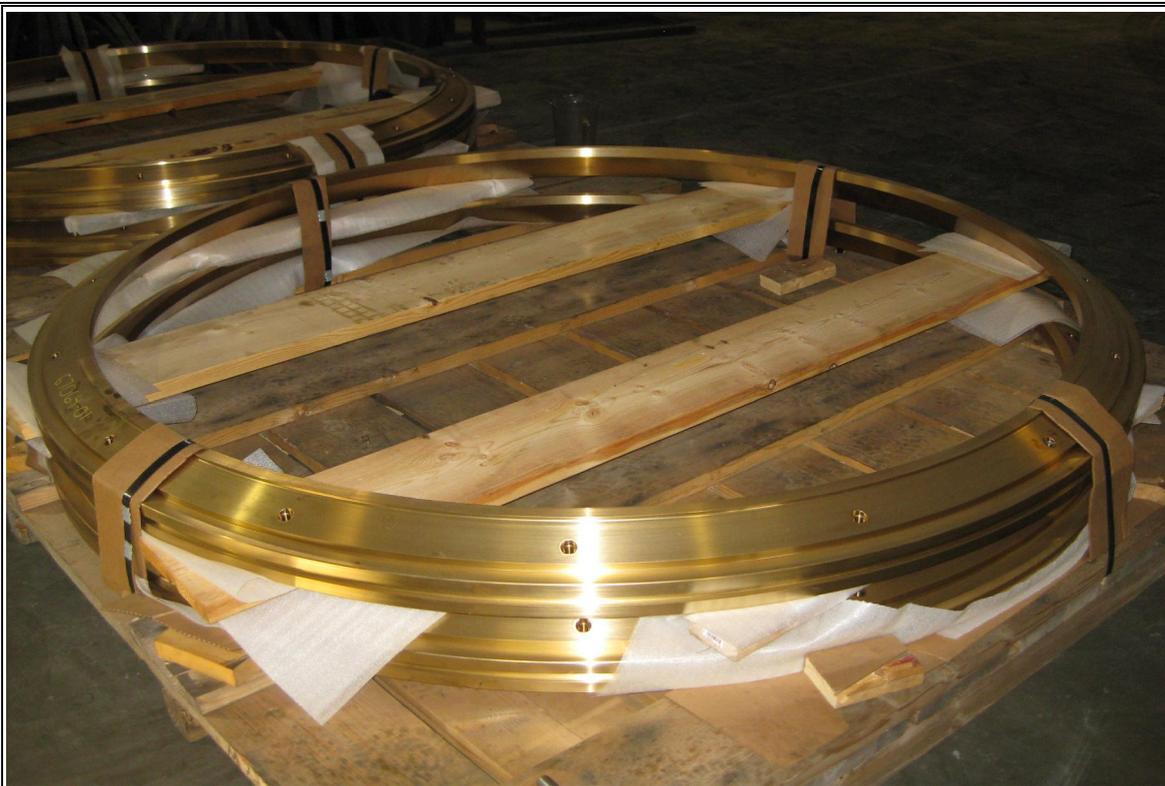

日期：日期：102.10.04

射流閘門備品（鋁青銅水封）檢視

地點：Hilton Valve工廠



日期：102.10.05

綜合討論（一）

地點：飯店會議室



日期：102.10.05

綜合討論（二） 開門運輸方式暨其他應注

地點：飯店會議室

意事項
